



GEBIEDSONTWIKKELING

PARTICIPATIE- EN COMMUNICATIEPLAN DRIJVEND ZONNEPARK OOSTERWEILANDEN

OPDRACHTGEVER:

Roelofs Planontwikkeling B.V.

PROJECTNUMMER:

31196243

DATUM:

3 december 2024



Bezoekadres
Kroezenhoek 8
7683 PM Den Ham

Postadres
Postbus 12
7683 ZG Den Ham

T +31 (0) 546 67 88 88
E info@roelofsgroep.nl

Tevens vestigingen in
Stadskanaal
Sneek
Steenwijk
Veenendaal
Spijkenisse
Weesp

PROJECTGEGEVENS:

Naam: [Participatie- en communicatieplan drijvend zonnepark Oosterweilanden](#)
Nummer: 31196243
Documentnr: [PP-D01- 31196243-dbk](#)
Status: Definitief
Datum: [3 december 2024](#)
Auteur: Diede ter Braak

OPDRACHTGEVER:

Roelofs Planontwikkeling B.V.
Kroezenhoek 8
7683 PM, Den Ham

AUTORISATIE

Naam: Patrick Neijs
Handtekening:

Datum: [3-12-2024](#)

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
1. Participatievereisten gemeente Twenterand	5
2. Projectomschrijving	6
2.1 De ontwikkeling.....	6
2.2 Planologische procedure.....	6
2.3 Financiële participatie	8
2.4 Beslismomenten.....	9
3. De participatieaanpak	10
Waarom?.....	10
Met wie?.....	10
Waarover?.....	11
Hoe?	11
Communicatieacties	11
Participatiematrix.....	13

INLEIDING

AANLEIDING

Zandwinning Oosterweilanden B.V. is van plan een drijvend zonnepark te realiseren op de zandwinplas Oosterweilanden in Vriezenveen (zie figuur 1). Zandwinning Oosterweilanden B.V. is eigenaar van deze zandwinplas. Op dit moment is er sprake van een actieve zandwinning. Doordat er sprake is van een actieve zandwinning is de ruimte voor een zonnepark op de plas beperkt. Daarnaast is de ruimte voor landschappelijke inpassing voor het drijvende zonnepark ook beperkt, aangezien er al een vastgesteld inrichtingsplan van de zandwinning ligt. In afstemming met de zandwinning is een locatie bepaald waar het zonnepark kan komen te liggen.

Ondanks dat de ruimte voor de ruimtelijke inpassing van het zonnepark beperkt is, vinden wij het belangrijk om belanghebbende partijen goed te betrekken en te informeren over deze ontwikkeling. In dit participatie- en communicatieplan hebben we uiteengezet hoe wij de participatie en communicatie tijdens de ontwikkeling van het park voor ons zien. De focus ligt hierbij op het ontwikkelproces en op welke momenten we belanghebbende partijen hierbij betrekken en informeren. Dit gaat met name over de planologische procedure, zie hiervoor paragraaf 2.2. Ook hebben we opties op een rij gezet over de wijze waarop financiële participatie een rol kan krijgen binnen de ontwikkeling, zie hiervoor paragraaf 2.3




Figuur 1: plangebied voor ontwikkeling drijvend zonnepark

DOELSTELLING

Het doel van het zonnepark is om de zandwinning Oosterweilanden te voorzien van stroom die is opgewekt door drijvende zonnepanelen. Directe koppeling leidt tot verdere verduurzaming van de zandwinactiviteiten en zorgt voor minder belasting van het stroomnet.

Daarnaast draagt de ontwikkeling van dit drijvende zonnepark eraan bij dat de gemeente Twenterand haar RES-doelstelling kan halen om in 2030 82 GWh energie op te wekken waarvan nog 20 GWh via zonne-energie. Het plusminus 10 hectare drijvend zonnepark wekt zo ongeveer 20.000 MWh per jaar op. Dit staat gelijk aan wat 5.700 huishoudens jaarlijks aan stroom verbruiken.

Ook komt de ontwikkeling van een drijvend zonnepark tegemoet aan de wens van de raad over de volgorde van de opwek van duurzame energie (Motie 47: "Volgordelijke maatregelen RES Twente gemeente Twenterand"). Met zon op dak kan er de komende jaren beperkt stroom worden opgewekt om verschillende redenen (nr. 1 op de lijst). Voor zon op water zijn er meer kansen om vóór 2030 in totaal het benodigde GWh op te wekken (nr. 2 op de lijst).

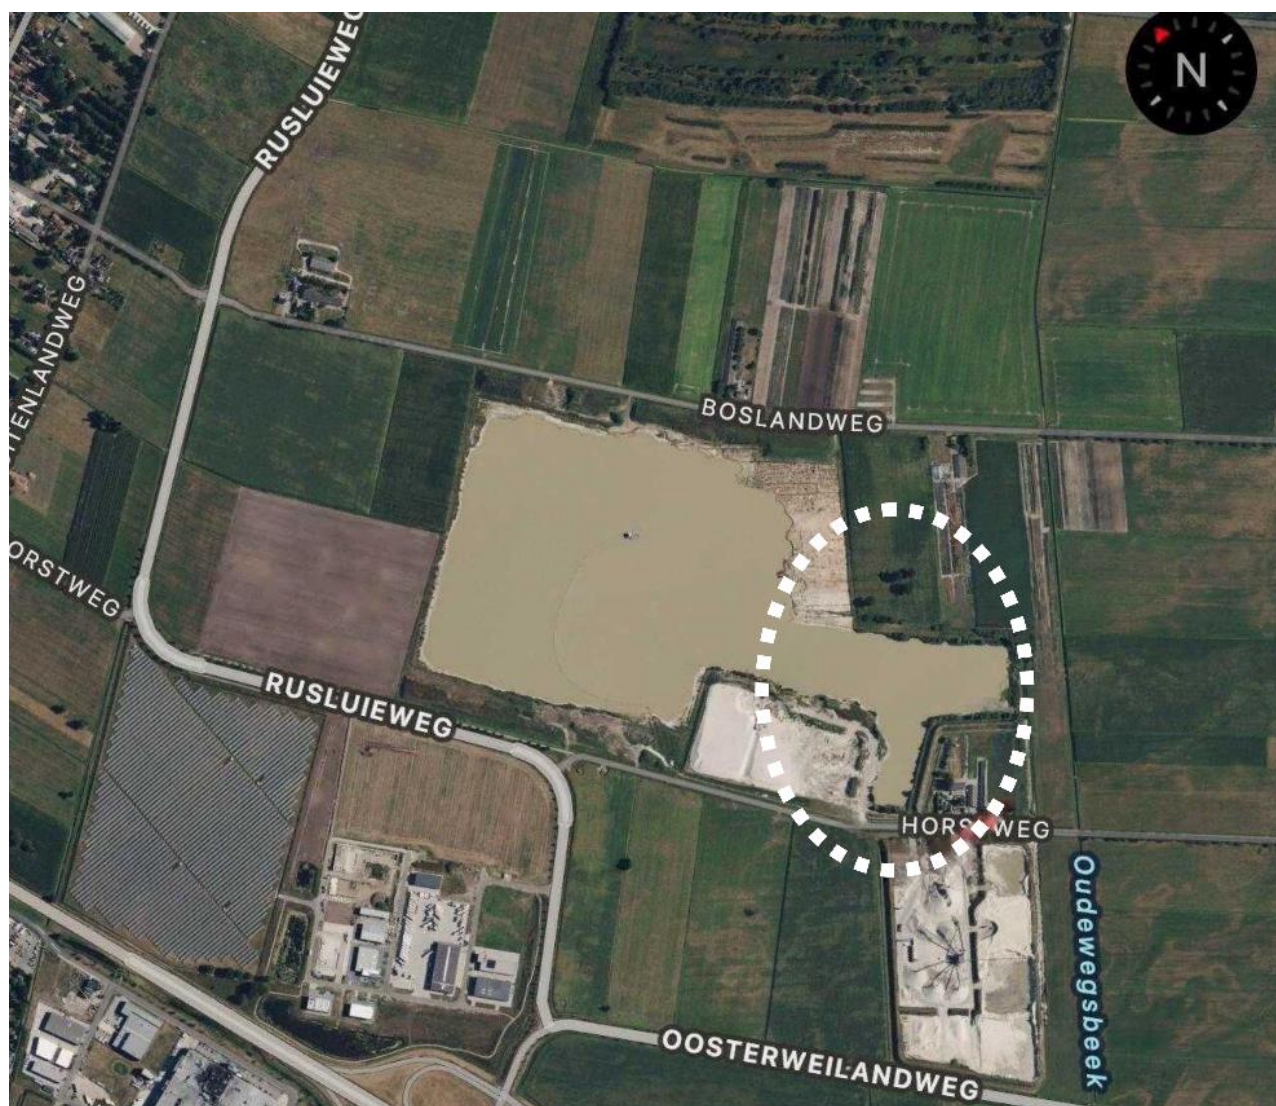

Figuur 2: nadere duiding plangebied voor ontwikkeling drijvend zonnepark

1. PARTICIPATIEVEREISTEN GEMEENTE TWENTERAND


In november 2022 heeft de gemeente Twenterand het Participatiebeleid Twenterand vastgesteld. In dit beleid heeft de gemeente een aantal uitgangspunten vastgesteld over haar visie op participatie. In een aantal gevallen is participatie verplicht, waaronder voor een aantal zogeheten buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA). In de gemeente Twenterand geldt ook dat participatie verplicht is voor de ontwikkeling van een drijvend zonnepark. Dit is vastgelegd in het door de gemeenteraad genomen "Besluit over het bindend adviesrecht bij omgevingsplanactiviteiten buiten plangebieden, de participatie bij omgevingsplanactiviteiten buiten plangebieden, en het delegeren van bepaalde taken onder de Omgevingswet". ([Besluit over het bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, de participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en het delegeren van bepaalde taken onder de Omgevingswet | Lokale wet- en regelgeving](#)) Hoe we aan de gestelde voorwaarden op het gebied van participatie voldoen leggen we vast in dit participatie- en communicatieplan.

2. PROJECTOMSCHRIJVING

Om een zorgvuldig participatieproces te doorlopen vinden wij het belangrijk de procesfasen zo scherp mogelijk te formuleren. Op basis van de procesfasen zetten wij gerichte participatie- en communicatieacties uit. In dit hoofdstuk lichten we de ontwikkeling nader toe en komen de verschillende procesfasen naar voren, inclusief belangrijke beslismomenten.

2.1 DE ONTWIKKELING

Het plangebied voor de potentiële ontwikkeling is weergegeven in figuur 3. De ontwikkeling beoogt 100.000 m²/10 hectare drijvende zonnepanelen.

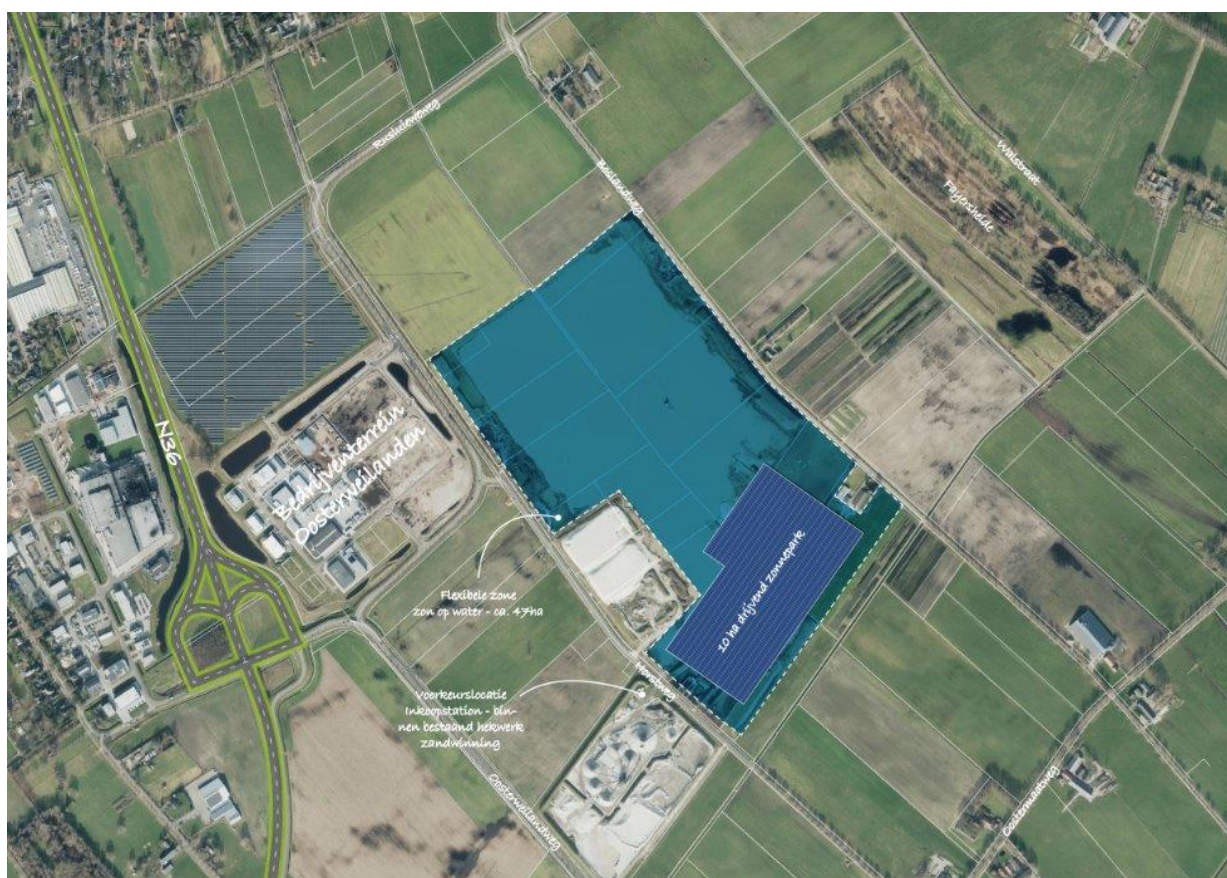

Figuur 3: ontwerpschets drijvend zonnepark

2.2 PLANOLOGISCHE PROCEDURE


Dit participatieplan richt zich onder andere op de participatie- en communicatieacties die we uitzetten gedurende de planprocedure. In de participatiematrix, weergegeven in de laatste pagina's van dit plan, geven we een nadere toelichting op de geplande acties.

Fase 1: Initiatieffase

Opleveren: ambitiedocument en schetsuitwerking

- Gesprekken met bevoegde gezagen en nutsbedrijven

- Ambtelijke afstemming met projectleider, participatie- en communicatieadviseur over participatie- en communicatieplan
- Keukentafelgesprekken aangrenzende perceel/landbouwgrond eigenaren
- Omwonenden Boslandweg en Oostermaatweg (zie figuur 4) informeren + uitnodigen inloopmoment

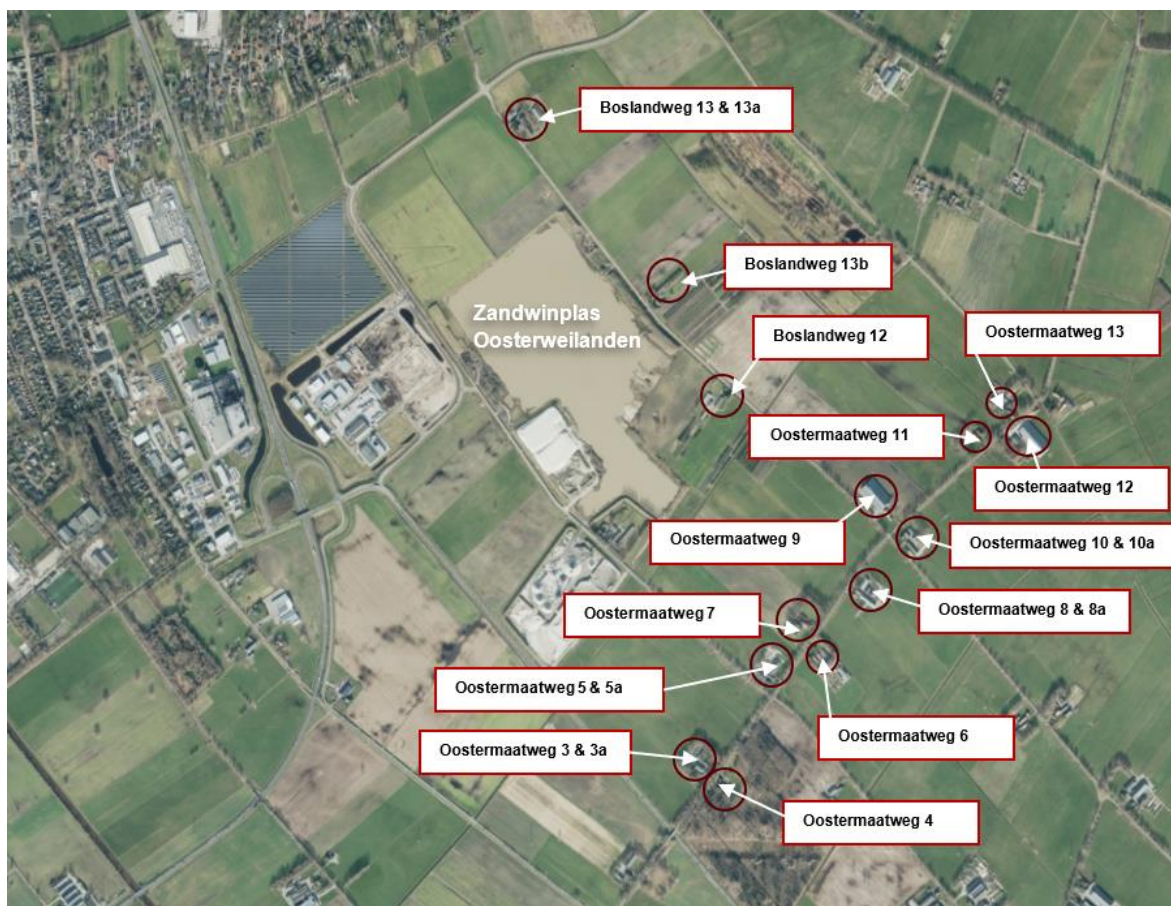

Figuur 4: overzicht omwonenden

- Keukentafelgesprek Vereniging Oud Vriezenveen
- Staatsbosbeheer en KNNV informeren + mogelijkheid bieden voor een gesprek
- Dorpsraad Vriezenveen informeren + uitnodigen inloopmoment
- Verkennend gesprek met vertegenwoordiger van Bedrijven Belangen Vriezenveen
- Inloopbijeenkomst met omgeving woensdag 15 januari 2025
- Raadsdebat bespreken opties financiële participatie 20 of 21 januari 2025
- Raadsvergadering opdracht uitwerking financiële participatie 4 februari 2025

Fase 2: Vergunningenfase

Opleveren: inrichtingsplan

- Input verzamelen inloopbijeenkomst en keukentafelgesprekken. Eventueel verwerken en of aanpassen in initiatief.
- Afstemmen met bevoegde gezagen over inhoud vergunningaanvraag
- Inrichtingsplan concretiseren met KNNV, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel

- Terugkoppeling geven aan aanwezigen inloopbijeenkomst/stakeholders over stand van zaken/vergunningaanvraag
- Technische tekeningen uitwerken

Fase 3: Ontwerpbesluit

Opleveren: technische uitwerking inrichtingsplan

- Raadsvergadering over ontwerpbesluit (gepland 1 juli 2025)
- Inloopbijeenkomst over ontwerpbesluit (nog in te plannen). Inzage geven in ontwerpbesluit en onderliggende documenten.

Fase 4: Definitief besluit

Opleveren: definitieve technische uitwerking inrichtingsplan

- Raadsvergadering definitief besluit (gepland 11 november 2025)
- Betrokkenen (omwonenden en stakeholders) informeren over het genomen besluit en vervolg proces realisatie zonnepark.

**Gedurende het proces vinden communicatieacties plaats. Zie hiervoor 'communicatieacties' onder hoofdstuk 3.*

2.3 FINANCIËLE PARTICIPATIE

De mogelijkheden voor financiële participatie bij dit project is onderverdeeld in 1. een bijdrage doen aan een omgevingsfonds en 2. de mogelijkheid geven aan de gemeente of omwonenden om voor 50% lokaal eigenaar te worden in het park. Hieronder gaan we kort in op beide mogelijkheden.

1. Omgevingsfonds

Initiatiefnemer committeert zich om een jaarlijkse bijdrage te doen aan het omgevingsfonds (bestaand of nog op te richten) uit de exploitatie van het zonnepark. Dit betekent dat de initiatiefnemer per opgewekte MWh 50 eurocent bijdraagt gedurende de exploitatie van het zonnepark. Met een verwachte opbrengst van circa 15 miljoen KWh zal dit bestaan uit een bijdrage van circa 7.500 euro per jaar.

2. Lokaal eigenaarschap (50%)

Initiatiefnemer biedt de kans aan de gemeente en/of omwonenden om voor 50% lokaal eigenaar te worden van het park. Dit kan op de volgende manieren:

Optie 1: de gemeente neemt deel als mede-ontwikkelaar en draagt voor 50% bij aan de ontwikkel- en investeringskosten en wordt voor 50% eigenaar van het zonnepark. Ook deelt de gemeente voor 50% in de revenuen van het park.

Optie 2: initiatiefnemer ontwikkelt het zonnepark. Op het moment dat er een financieringsbesluit genomen moet worden (voor start bouw) krijgt de gemeente de mogelijkheid om voor 50% eigenaar te worden van het park en draagt de helft van de investeringskosten voor het bouwen van het drijvend zonnepark.

Optie 3: initiatiefnemer ontwikkelt en bouwt het park. Nadat het park gerealiseerd is krijgt de gemeente de mogelijkheid om 50% van de investeringskosten mede te financieren via een crowdfunding/obligatielening. Als de gemeente dit bedrag niet in zijn geheel wil financieren dan kan deze mogelijkheid ook worden gegeven aan omwonenden/bewoners van de gemeente Vriezenveen.

Processtappen

Afhankelijk van de keuze die de gemeente maakt worden er afspraken vastgelegd in de vorm van een intentie- en/of exploitatieovereenkomst. Omdat nu nog niet duidelijk is voor welke optie de gemeente gaat, kunnen procesafspraken worden gemaakt in de planologische procedure en de daarbij behorende exploitatieovereenkomst/antérieure overeenkomst. De volgende momenten kunnen vastgelegd worden:

- Vaststellen bopa-besluit en exploitatieovereenkomst. Als duidelijk is welke route de gemeente wil doorlopen, kunnen de afspraken hierover worden vastgesteld in de exploitatieovereenkomst.
- Financieringstraject voor de bouw van het zonnepark. De verwachting is dat het financieringstraject in 2027 gaat lopen. Op het moment dat de financiering geregeld wordt, krijgt de gemeente de kans om voor 50% mee te investeren.
- Na bouw van het park. De verwachting is dat het park in 2028 wordt gerealiseerd. Na de bouw krijgt de gemeente de mogelijkheid om voor 50% aan eigen vermogen in te leggen in het park door middel van een obligatielening en of crowdfunding. Als de gemeente besluit dit niet te doen, dan kan deze regeling opengesteld worden voor omwonenden/inwoners van gemeente Twenterand.

2.4 BESLISMOMENTEN

Er zijn een aantal kritische beslismomenten in het proces. Met name de te nemen besluiten van gemeente Twenterand op het gebied van ruimtelijke ordening en eventuele samenwerkingsafspraken over de financiering en exploitatie van het zonnepark.

Collegebesluit

- Antérieure overeenkomst óf joint venture overeenkomst/exploitatieovereenkomst/participatieovereenkomst
- Beoordeling ruimtelijke onderbouwing (13 mei 2025)
- Besluit omgevingsvergunning bouwactiviteit (9 juli 2025)

Raadsbesluit

- Behandeling ontwerpbesluit t.b.v. terinzagelegging (1 juli 2025)
- Besluit vaststellen BOPA (raadsvergadering 11 november 2025)
- Besluit tot oprichting of deelname in een rechtspersoon
- Budgetbesluit voor investeringskapitaal

3. DE PARTICIPATIEAANPAK

WAAROM?

Het doel van het participatietraject is om de omgeving constructief te betrekken bij de plannen. Met name (kennis)partners betrekken we om de kwaliteit van de plannen te verbeteren.

MET WIE?

Er zijn diverse publieksgroepen die we gedurende deze planprocedure gaan betrekken. Deze hebben we ingedeeld in drie groepen, namelijk: partijen met wie we nauw samenwerken, partijen waar we advies bij opvragen ofwel een toetsende partij, en tot slot de omgeving en gebruikers van het gebied.

Samenwerkende partijen

- Hydronex
- Gemeente Twenterand
 - Gemeenteraad
 - College van B&W
 - Ambtelijke organisatie
- Oosterweilanden B.V.

Advies/toetsende partijen

- Provincie Overijssel
- Enexis
- Waterschap Vechtstromen
- Omgevingsdienst
- Veiligheidsregio en brandweer Twente
- Verdere adviesbureaus t.b.v. onderzoeken BOPA-procedure

Omgeving/gebruikers

- Bestaande zonnepark Oosterweilanden B.V.
- Aangrenzende perceeleigenaren
- Directe omwonenden (zie figuur 4)
- Bedrijven Belangen Vriezenveen
- Dorpsraad Vriezenveen
- Inwoners Vriezenveen e.o.
- Staatsbosbeheer (eigenaar en beheerder Fayersheide)
- Landschap Overijssel
- Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV [KNNV Landelijk - Natuurvereniging voor veldbiologie](#)
- Tegenwind Vriezenveen

WAAROVER?

Gedurende het proces informeren we de in kaart gebrachte publieksgroepen via onder andere de in te richten projectwebsite over de gezette stappen. Daarnaast is er ook ruimte voor hun inbreng. Hieronder is aangegeven wat de kaders zijn, en ook welke ruimte voor inbreng er is voor publieksgroepen.

Wat staat er al vast/zijn de kaders?

- De locatie van het plangebied
- Het totaal aan vierkante meter (10 hectare) zonnepanelen
- De technische constructie voor het drijvend zonnepark
- De locatie van het inkoopstation (koppeling met het elektriciteitsnet)
- Inpassingseisen van provincie (o.a. landschap)
- Het totaal aan vierkante meter aan te leggen zonnepanelen
- Type, grootte en kleur zonnepanelen
- Positionering/verschuiven van de panelen op de waterplas

Voor welke besluiten is ruimte voor inbreng van de omgeving?

- Landschappelijke inpassing
- Inrichting oevers
- Aandragen relevante (tot dusver onbekende) ontwikkelingen in het gebied door in kaart gebrachte publieksgroepen/stakeholders

HOE?

Na afstemming tussen gemeente en Hydronex wordt bepaald welke gespreksvormen het meest passend zijn. We zetten diverse middelen in om te participeren ofwel te communiceren, zoals:

- Individuele gesprekken met verschillende publieksgroepen
- Inloopmomenten en bijeenkomsten
- Inzet van een website/projectpagina
- Informatiebrieven (+ in bepaalde gevallen uitnodiging voor gesprek)
- Nieuwsberichten
- Persberichten

COMMUNICATIEACTIES

- Brieven en gesprekken met omwonenden + andere belanghebbenden.
- Kenbaar maken inloopbijeenkomst 15 januari 2025.
- Delen visuele weergave van een drijvend zonnepark op de voorgenomen locatie.
- Projectwebsite lanceren
- Nieuwsbrief voor geïnteresseerden

PARTICIPATIEMATRIX

Per projectfase beschrijven waarom, met wie, hoe en wanneer we in gesprek gaan met verschillende belanghebbenden/publieksgroepen

Waarom	Waarover			Met wie		Hoe	Wanneer	(inspraak Awb)
Projectfasen en stappen	Eindresultaat	Participatie-doel	Participatie-ruimte	Participatievraag	Publiek	Betrokkenheid	Gespreksvorm	Wanneer
Fase 1: Initiatieffase <i>*Opstellen ambitiedocument en schetsuitwerking</i>								
Gesprekken met bevoegde gezagen/nutsbedrijven	Randvoorwaarden en uitgangspunten in beeld	Kwaliteit	Adviseren	Met welke randvoorwaarden en aandachtspunten moeten we rekening houden voor de ontwikkeling van een drijvend zonnepark op deze locatie?	Provincie Overijssel Waterschap Vechtstromen Omgevingsdienst(en) Veiligheidsregio Enexis RVO Vitens	Meedenken	Gesprek op locatie/ mail	> december 2024
Ambtelijke afstemming over participatieplan	Nadere duiding van de randvoorwaarden op het gebied van participatie	Kwaliteit	Adviseren	Inhoudelijke reactie op het concept participatieplan. Zijn er zaken die in het participatieplan ontbreken	Projectleider, participatieadviseur, communicatieadviseur	Meedenken	Teams-afpraak	19 november en 3 december 2024

n met projectleider, participatie- en communicatie adviseur				of die we verder moeten uitwerken?					
Oploop/comm issievergaderin g gemeenteraad	Meenemen van de gemeenteraad in het te doorlopen participatie-proces	Constructief betrekken van de omgeving	Raadplegen	Highlights participatieplan delen + vragen wat raadsleden belangrijk vinden v.w.b. het betrekken van de omgeving bij de beoogde ontwikkeling	Raadsleden commissievergadering	Meedenken	Gesprek op gemeentehuis (door projectleider gemeente)	20 november 2024	
Keukentafelgesprekken met aangrenzende perceel/landbouwgrondeigenaren	Goed geïnformeerde burens	Constructief betrekken van de omgeving	Informereren + raadplegen	Dit zijn onze plannen voor de ontwikkeling van een drijvend zonnepark. Zijn er ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden? We bieden de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek	Aangrenzende perceel/landbouwgrondeigenaren Oostermaatseweg 5a en 7 Boslandweg 12, 13 en 13a	Meeweten	Keukentafelgesprek + informatiebrief	December 2024	
Omwonenden (Boslandweg en Oostermaatweg informeren + uitnodigen inloopmoment	Goed geïnformeerde burens	Constructief betrekken van de omgeving	Informereren	Dit zijn onze plannen voor de ontwikkeling van een drijvend zonnepark. Ruimte voor vragen/gesprek tijdens inloopmoment 15 januari 2025	Omwonenden (zie figuur 4)	Meeweten	Informatiebrief + contactgegevens omgevingsmanager + uitnodiging inloopmoment 15 januari 2024	4 december 2024	
Verkennd gesprek	Een beeld bij (belangrijke) gebiedskenmerk	Kwaliteit	Raadplegen	Zijn er zaken waar we wat u betreft rekening mee moeten houden voor de	Vereniging Oud Vriezenveen	Meedenken	Brief + mogelijkheid bieden voor	December 2024 – januari 2025	

Vereniging Oud Vriezenveen	en in en rondom het plangebied			ontwikkeling van een drijvend zonnepark op deze locatie?			gesprek + uitnodiging inloop-moment		
Staatsbosbeheer en KNNV informeren + mogelijkheid bieden voor een gesprek	Goed geïnformeerde burens plus een beeld bij belangrijke ontwikkelingen in het gebied v.w.b. flora- en fauna	Constructief betrekken van de omgeving	Informeren + raadplegen	Informeren over de plannen, mogelijkheid bieden voor het delen van informatie en het inplannen van een gesprek.	Staatsbosbeheer KNNV	Meedenken	Informatie-brief + mogelijkheid bieden voor gesprek + KNNV uitnodiging inloop-moment	December 2024 – januari 2025	
Dorpsraad Vriezenveen informeren + uitnodigen inloopmoment	Belangenvertegenwoordigers van de kern Vriezenveen goed informeren	Constructief betrekken van de omgeving	Informeren + raadplegen	Informeren over de plannen, mogelijkheid bieden voor het delen van informatie en uitnodiging voor inloopmoment	Dorpsraad Vriezenveen	Meedenken	Informatie-brief + uitnodiging inloop-moment	December 2024 – januari 2025	
Verkennd gesprek met Bedrijven Belangen Vriezenveen	Ontwikkelingen Bedrijvenpark Oosterweilanden goed in beeld	Kwaliteit	Raadplegen	Zijn er ontwikkelingen in en rondom Bedrijvenpark Oosterweilanden die van belang zijn om te weten voor de ontwikkeling van het drijvend zonnepark? +	Bedrijven Belangen Vriezenveen	Meedenken	Gesprek op nader te bepalen locatie + brief met informatie voor bedrijven Bedrijvenpark Oosterweilanden	December 2024 – januari 2025	
Behandeling raadsvoorstel	Een goed geïnformeerd college en gemeenteraad	Constructief betrekken van de omgeving	Besluit nemen	N.v.t.	Collegeleden Twenterand	Bepalen	Collegetafel	17 december 2024	

college van B&W	over de participatie- en communicatie-acties die we gaan uitzetten voor de ontwikkeling van het drijvend zonnepark								
Inloopbijeenkomst omgeving	Een goed beeld van de ontwikkelingen in de buurt en behoeftes van belanghebbende partijen	Kwaliteit + constructief betrekken van de omgeving	Informer en raadplegen	Presenteren ambitiesdocument + ophalen ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden	Omgeving, (zie figuur 4) + verdere belanghebbenden en geïnteresseerden uit Vriezenveen	Meedenken	De Büüle, Oosteinde 50 in Vriezenveen	15 januari 2025	
Raadsdebat opties financiële participatie	Een richting over welke optie voor financiële participatie de voorkeur van de raad heeft	Kwaliteit + constructief betrekken van de omgeving	Kaders stellen	Welke optie voor financiële participatie heeft de voorkeur van de raad? + zijn er aandachtspunten voor het participatieplan?	Gemeenteraadsleden	Bepalen + meedenken	Raadsvergadering	20/21 januari 2025	
Raadsvergadering opdracht uitwerking financiële participatie	Een opdracht aan het college om een voorstel uit te werken over de invulling van lokaal eigenaarschap/financiële participatie	Eigenaarschap	Besluit nemen	Het college vragen een voorstel uit te werken over de invulling van lokaal eigenaarschap/financiële participatie voor deze ontwikkeling	Gemeenteraadsleden	Bepalen	Raadsvergadering	4 februari 2025	Inspreekmogelijkheid. Aanmelden bij griffie

Fase 2: <u>Vergunningfase</u> <i>*Opstellen inrichtingsplan</i>									Vormvrije MER-procedure
Afstemming met bevoegde gezagen over inhoud vergunningaanvraag	De benodigde informatie voorhanden om een vergunningaanvraag in te kunnen dienen	Kwaliteit	Adviseren	Is alle informatie voorhanden om een vergunningaanvraag in te kunnen dienen?	Provincie Overijssel Waterschap Vechtstromen Omgevingsdienst (en) Veiligheidsregio	Meewerken	Contact per mail en telefoon	Maart – april 2025	
Inrichtingsplan concretiseren	Een nader uitgewerkt inrichtingsplan	Kwaliteit + constructief betrekken van de omgeving	Raadplegen	Wat is wat jullie betreft een wenselijke inrichting van het drijvend zonnepark/wat zijn passende te nemen (extra) maatregelen t.b.v. de inrichting van de zandwinplas?	Landschap Overijssel KNNV Staatsbosbeheer	Meedenken	Gesprek op nader te bepalen locatie	Maart – 7 april 2025	
Technische tekeningen uitwerken	Een technisch uitgewerkt inrichtingsplan	Kwaliteit en eigenaarschap	Bepalen	Aan welke technische voorwaarden moet het inrichtingsplan voldoen?	Adviesdienst Roelofs	Meewerken	Geschikte tekenprogramma's	7 – 13 april 2025	
Fase 3: <u>Ontwerpbesluit</u> <i>*Opstellen technische uitwerking inrichtingsplan</i>									

Raadsvergadering over ontwerpbesluit	Een vastgesteld inrichtingsplan	Eigenaarschap	Besluit nemen	Behandelen inrichtingsplan + nemen ontwerpbesluit	Gemeenteraadsleden	Bepalen	Raadsvergadering	1 juli 2025	Inspreekmogelijkheid. Aanmelden bij griffie
Inloopbijeenkomst over ontwerpbesluit	Verzameling op- of aanmerkingen op het inrichtingsplan	Kwaliteit	Raadplegen	Informereren over het inrichtingsplan + raadplegen of er onderwerpen zijn waar wat betreft de deelnemers van de inloopbijeenkomst het inrichtingsplan op moet worden aangepast	Omgeving (zie figuur 4) + verdere belanghebbenden en geïnteresseerden uit Vriezenveen	Meedenken	Gemeentehuis Twenterand	14 – 20 juli 2025	Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage voor zienswijzen
Fase 4: definitief besluit <i>*Opleveren: definitieve technische uitwerking inrichtingsplan</i>									Aanleveren zienswijzennota door initiatiefnemer
Raadsvergadering definitief besluit	Vaststelling BOPA	Eigenaarschap	Besluit nemen	Definitief besluit over BOPA	Gemeenteraadsleden	Bepalen	Raadsvergadering	11 november 2025	
